



Maître d'Ouvrage :
NEXITY - 17, rue des Lombards – 60200 COMPIEGNE
Assistance à maîtrise d'ouvrage :
HAUTS-DE-FRANCE PASS RÉNOVATION - RRSPEE –
11, mail Albert 1^{er} – 80000 AMIENS
Tranche 01 : Résidence ARISTIDE BRIAND
MARGNY-LES-COMPIEGNE – 2-14 rue Pasteur
Travaux de réhabilitation de 56 logements

Compte-rendu de réunion de chantier n° 09 du 17 octobre 2022

			P = Présent R = Représenté E = Excusé A = Absent	Prochaine réunion Convoquée Non convoquée Invitée	D = Diffusion ND = Non diffusé
Christine CARRIER Gestionnaire de copropriété	Maître d'Ouvrage : NEXITY - Cabinet FAUCHILLE 17, rue des Lombards 60200 COMPIEGNE	☎ : 03-44-85-42-84 ☎ : 07-63-11-89-56 @ : CCARRIER@nexity.fr		Invitée	D e-mail
Lucie DIOP Responsable copropriétés	Assistance au Maître d'Ouvrage : REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L'EFFICACITE ERNEGETIQUE [RRSPEE] 5E, boulevard du Port d'aval 80000 AMIENS	☎ : 03-65-89-07-19 (Lucie DIOP) ☎ : 06-45-94-36-31 (Lucie DIOP) @ : lucie.diop@hautsdefrance-spee.fr ☎ : 03-65-88-95-63 (Kemal M'FOUNGOULIE) ☎ : 06-45-76-19-61 (Kemal M'FOUNGOULIE) @ : kemal.mfoungoulie@hautsdefrance-spee.fr		Invités	D e-mail
Anne LEROY Présidente du CS	Conseil Syndical de la Résidence	☎ : 03-44-83-12-03 ☎ : 06-47-18-30-89 @ : anne.leroy742@orange.fr		Invitée	D e-mail
Vincent FRÉRARD Chargé d'affaires	Maîtrise d'Œuvre : CABINET SILVERT 15, bld Ernest Noël - BP 70031 60402 NOYON cedex	☎ : 03-44-44-26-19 ☎ : 06-45-61-08-03 @ : v.frerard@silvert.fr	P		
Marielle DAME Coordinateur S.P.S.	Coordonnateur SPS : SOCOTEC 518 rue Saint Fuscien Immeuble La Croix Rompu Bureau 224 – RdC 80000 AMIENS	☎ : 03-22-52-19-16 ☎ : 07-84-24-02-69 @ : marielle.dame@socotec.com		Invitée	D e-mail
Merve ATAK Contrôleur Technique	Contrôleur Technique : APAVE NORD-OUEST SAS 29, rue de la Croix de Pierre CS 71328 80084 AMIENS Cedex 2	☎ : 03-22-54-73-80 ☎ : 07-64-88-37-00 @ : merve.atak@apave.com		Invitée	D e-mail
Nicolas PEREIRA Conducteur de travaux Mohamed BEN ABDALLAH Conducteur de travaux Carlos CROZ Chef de chantier	Lot 01 : Façades Entreprise SPEBI 85 Bis Rue Jean Le Galleu 94200 IVRY-SUR-SEINE	☎ : 01-46-70-21-21 @ : technique@spebi.fr ☎ : 06-52-56-61-45 (Nicolas PEREIRA) @ : nicolas.pereira@spebi.fr ☎ : 06-72-15-40-09 (Mohamed ABDALLAH) @ : mohamed.ben-abdallah@spebi.fr	P P	Convoquée	D e-mail
Jérémy ANDRIEU Conducteur de travaux	Lot 02 : Couverture - Étanchéité Lot 04 : Menuiseries Entreprise SAS BHF DELAPLACE Z.A.C du capron - Route de tainils 80480 SAINT LEU	☎ : 03-22-90-84-40 ☎ : 06-43-80-00-68 @ : j.andrieu@bhf-delaplace.fr @ : contact@bhf-delaplace.fr	P	Convoquée	D e-mail
Anthony BECQUE Ingénieur travaux Thierry ANCELIN Conducteur de travaux	Lot 03 : Chauffage Ventilation Entreprise DALKIA 59 Avenue d'Italie – CS 70338 80003 AMIENS Cedex 1	☎ : 03-22-82-83-09 ☎ : 06-01-28-24-70 @ : anthony.becque@dalkia.fr @ : thierry.ancelin@dalkia.fr ☎ : 06-11-01-56-36	A A	Convoquée	D e-mail

ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX :

Le 12 avril 2022 – Début des travaux le 12 juin 2022 - Délai d'exécution 8 mois - Fin prévisionnelle des travaux le 12 février 2023

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER : Le lundi 24 octobre 2022 à 10 h 30 (11 h 00 pour les Membres du CS).
Entreprise(s) convoquée(s) : SPEBI, BHF DELAPLACE et DALKIA.

Également présent(e) : Madame DECHEPY – Membre du Conseil Syndical.
 Monsieur MORELLE – Membre du Conseil Syndical.
 Monsieur VAN VOOREN – Membre du Conseil Syndical.
 Madame DECAUDAIN – Membre du Conseil Syndical.
 Entreprise BHF : Romain SECLET.
 Entreprise DALKIA : Aurélien CHERON aurelien.cheron@dalkia.fr (06 30 57 37 04).
 Corentin BOITEL corentin.boitel-triplet@dalkia.fr (06 03 54 52 19).
 Clément DOUDELET clement.doudelet@dalkia.fr (06 25 68 76 12).

Pièce(s) jointe(s) : Sans objet.

Observations urgentes : TOUTES ENTREPRISES : Le Nettoyage du chantier doit être fait au jour le jour : **PM**.
ALKIA : Il vous appartient de déplacer l'isolation thermique dans les combles, avec soin, pour réaliser vos relevés (isolation thermique existante conservée).
SPEBI : Clôtures à terminer (en attente de livraison).
 En attente de l'inspection commune pour le début de travaux de finition du sous-traitant.
 « L » aux angles des baies non conformes à reprendre – Appuis et seuils à scier.

Avancement Général :

SPEBI – Lot n° 01 "Traitement des façades" :	8.42	%
BHF DELAPLACE – Lot n° 02 "Couverture Etanchéité Zinguerie" :	26.77	%
DALKIA – Lot n° 03 "Chauffage Ventilation" :	0.00	%
BHF DELAPLACE – Lot n° 04 " Menuiseries extérieures et intérieures " :	0.00	%
Avancement Tous Corps d'État base marché :	9.41	%

Effectifs moyens :

Entreprise :	Semaine n° 37 :	Semaine n° 38 :	Semaine n° 39 :	Semaine n° 40 :	Semaine n° 42 :
Entreprise SPEBI	02 personnel (s)	00 personnel (s)	00 personnel (s)	00 personnel (s)	05 personnel (s)
Sous-traitant CCIB de SPEBI	02 personnel (s)	00 personnel (s)	00 personnel (s)	03 personnel (s)	00 personnel (s)
Entreprise BHF DELAPLACE	personnel (s)	00 personnel (s)	02 personnel (s)	00 personnel (s)	02 personnel (s)
Entreprise DALKIA	personnel (s)	00 personnel (s)	00 personnel (s)	00 personnel (s)	00 personnel (s)
TOTAL	02 personnel (s)	00 personnel (s)	02 personnel (s)	03 personnel (s)	07 personnel (s)

Dossiers techniques :

Toutes les diffusions sont à réaliser par fichiers PDF y compris les plans.

AF = Avis Favorable – AS = Avis suspendu – AD = Avis défavorable.

Sans réponse écrite de l'Entreprise, les AS et AD ne seront pas levés.

	Avis du Maître d'Œuvre			Avis du Contrôleur Technique		
	Reçu le	Avis	Visé le	Reçu le	Avis	Visé le
SPEBI lot 1						
DT V1	24/05/22	Visa 3 : AS n° 19	29/08/22	21/09/22		À viser
PLANS DE DÉTAILS indice B	31/08/22	(échantillon profil goutte d'eau)	05/09/22	26/09/22		À viser
	13/10/22		17/10/22	13/10/22		À viser
BHF DELAPLACE lots 2 et 4						
DT V1 Couv. – Zing. – Étanchéité	26/08/22	Visa 1 : AS n° 1 levé	17/10/22	À diffuser		À viser
DT men. Ext. et portes palières	12/09/22	Visa 2 : AS n° 2-7-9	26/09/22			À viser
DALKIA lot 3						
DT V1 Ventilation	16/06/22	Visa 1 : AS n° 2-3-4-5	29/08/22			
Calcul et plan ventilation	12/09/22	Visa 2 : AD n° 1	26/09/22	12/09/22		À viser
DT Chauffage	12/09/22	Visa 2 : AS n° 2-3-4-5-6-7	26/09/22	12/09/22		À viser

Inspections communes - PPSPS :

SPEBI : A jour sauf pour le sous-traitant : **Rappel**.

BHF DELAPLACE : A jour.

DALKIA : Inspection commune faite le 16 mai 2022 **sauf sous-traitant : PM**.
 PPSPS à fournir : **Rappel**.

Reprendre tous les isolants au droit des menuiseries extérieures : Constat de reprise au prochain rendez-vous de chantier par le Maître d'Œuvre avant mise en œuvre de la toile de renfort.



Entreprise BHF DELAPLACE :

Intempéries semaine : 0 jour.
Intempéries cumulées : 0 jour.
Absence aux rendez-vous : 0 absence.
Retard aux rendez-vous : 0 retard.

Avancement :

Phase 1 : Emoussage de couverture à 100 %.

Remplacement des tuiles à 100 %.

Révision des arêtiers et faîtages à 100 %.

Pose des gouttières à 100 %.

Etanchéité des toitures-terrasses, 1 à l'arrière et 2 à l'avant ce soir.

Trop-pleins 6 unités.

Nombre de tuiles remplacées : 3 unités.

Points divers :

Remise le 16/05/22 de la clef de l'accès au sous-sol de la cage d'escalier n° 14 et d'un badge d'accès : **PM**.

Bon état des étanchéités au pourtour des souches hors combles constaté, par contre, les enduits des souches se décollent (3 souches à ce jour) : Finir le sondage des étanchéités et des enduits des souches pour production des travaux modificatifs (suppression des étanchéités au pourtour et réfection des enduits) : **Pris en compte**.

Une sortie de tuile à douille à remplacer : **A poser**.

Prévoir le stockage des tuiles remplacées (sur une palette) pour constat et balance travaux, le cas échéant : **PC**.

Traitement curatif et préventif de la couverture (DIMOUSSE 2.0 de chez DIMOS dans le camion) différent de la fiche technique remise dans votre dossier technique : Produit validé mais fiche technique correspondante à fournir : **Rappel**.


Prévoir réalisation des platelages dans les combles avant les travaux de ventilation : En attente du plan d'exécution de d'ALKIA : **PM**.

Contacter le Syndic pour définir la teinte des portes palières (teinte extérieure et teinte intérieure) et le type de Béquillage.

Contacter le C.SPS pour demande d'intervention sur les toitures-terrasses Phases 2 et 3, avant la mise en place des échafaudages du Façadier, avec échafaudage roulant et clôtures.

Façade avant : Tabliers, rails et coffre de VR teinte blanche pour prise en compte.

Façade arrière : Tabliers et rails de VR teinte bois et coffre de VR teinte beige pour prise en compte.

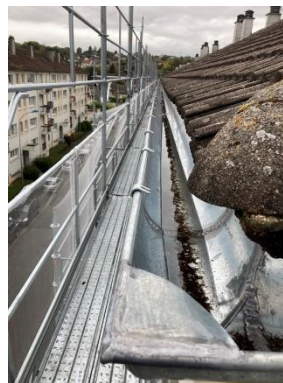

Entreprise DALKIA :

Intempéries semaine : 0 jour.

Intempéries cumulées : 0 jour. :

Absence aux rendez-vous : 1 absence (le 17/10/22).

Retard aux rendez-vous : 0 retard.

Remplacement robinets thermostatiques avec signature de l'occupant sur quitus et indication du nombre de robinet remplacés : **PM.**

Recensement des hottes à produire : **Pris en compte.**

Fournir les réservations des grilles d'entrée d'air au Menuisier : **Rappel.**

Problématique de fermeture des vannes en pied de colonne : A recenser : **En cours, produire devis à la suite.**

Conduits de raccordement de la VMC dans les combles présumés amianté : Le photo montrée ce jour ne correspond pas à un conduit de souche de cheminée, c'est soit la VH du vide ordure soit la VH de gaine gaz. Faire un relevé exhaustif des souches : Les combles sont accessibles par la présence d'un plancher en béton sous l'isolation.

Il vous appartient de déplacer l'isolation thermique dans les combles, avec soin, pour réaliser vos relevés (isolation thermique existante conservée).

Il vous appartient de déplacer l'isolation existante conservée pour effectuer votre visite des combles.

APAVE NORD-OUEST SAS (Contrôleur Technique) :

En attente de vos validations.

SOCOTEC (Coordonnateur SPS) :

En attente des PPSPS des Entreprises.

Maître d'Ouvrage :

Après les travaux d'isolation thermique par l'extérieur, il ne sera pas possible de poser « à neuf » les menuiseries extérieures : Pose en rénovation obligatoire : **PM.**

Il est demandé aux occupants d'attendre la fin des travaux de ventilation pour réaliser l'embellissement des pièces humides : **PM.**

Renvoyer la liste des propriétaires avec les numéros de téléphone (et mail) : **PM.**

Entrée 02, appartement 56, Mme DUMAS : Infiltration au droit du conduit de cheminé : Attendre la fin des travaux de couverture pour l'embellissement de la pièce : **PM.**

Il n'est pas prévu au marché de Té (ou coudes) de réglages sur les retours des radiateurs des logements, pas d'intérêt énergétique dans le programme du RSPEE, pas d'obligation fonctionnelle mais c'est mieux dans l'exploitation de l'installation de chauffage, cette prestation peut être réalisée par l'exploitant ou l'entreprise adjudicatrice du lot CVC en travaux supplémentaires. Il en ai de même pour les vannes en pied des colonnes : **PM.**

Nous avons bien prévu des thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs, pas de problème de fonctionnement, les circulateurs existants de chauffage en chaufferie, sont électroniques, à pression variable : **PM.**

Nous avons bien prévu des thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs, pas de problème de fonctionnement, les circulateurs existants de chauffage en chaufferie, sont électroniques, à pression variable : **PM.**

Recensement des hottes : Pris en compte.

- 🔧 Cage 08, logement 25 : Hotte raccordée soit sur la ventilation du local poubelle ou sur le futur conduit de ventilation : A déposer par le Propriétaire – Absence de la grille de ventilation haute dans la cuisine ? A justifier également : **Rappel.**

En attente du Maître d'Ouvrage pour les logements inaccessibles, soit :

- ✚ Cage 12 – Lgt 10 : **Refuse l'accès : Courrier du MO à produire.**
- ✚ Cage 10 – Lgt 18 : **Fait.**
- ✚ Cage 10 – Lgt 22 : **Fait.**
- ✚ Cage 08 – Lgt 26 : **Programmé.**
- ✚ Cage 08 – Lgt 28 : **Programmé.**
- ✚ Cage 08 – Lgt 30 : **Fait.**
- ✚ Cage 08 – Lgt 32 : **Fait.**
- ✚ Cage 06 – Lgt 34 : **En attente coordonnés du Propriétaire bailleur.**
- ✚ Cage 06 – Lgt 36 : **En attente coordonnés du Propriétaire bailleur.**
- ✚ Cage 06 – Lgt 38 : **Photo du 04/10/22 : Hotte apparemment raccordée à un conduit.**
- ✚ Cage 06 – Lgt 39 : **Photos du 04/10/22 mais raccordement de la hotte non confirmé.**
- ✚ Cage 04 – Lgt 43 : **A contacter.**
- ✚ Cage 04 – Lgt 44 : **Photos du 04/10/22 mais raccordement de la hotte non confirmé.**
- ✚ Cage 04 – Lgt 46 : **Photos du 04/10/22 mais raccordement de la hotte non confirmé.**
- ✚ Cage 04 – Lgt 47 : **Par photos, manque vérification de la présence éventuelle d'une hotte raccordée : À contacter.**
- ✚ Cage 02 – Lgt 49 : **Fait mais problématique de sécurité (logement en location) : A voir avec le Maître d'Ouvrage.**
- ✚ Cage 02 – Lgt 54 : **Par photos, manque vérification de la présence éventuelle d'une hotte raccordée : A priori hotte raccordée mais refuse d'envoyer une photo.**

Vincent FRÉRARD – Cabinet SILVERT – Maître d'Œuvre :

Planning général des travaux à produire suite à la réception du planning de DALKIA.

Toutes Entreprises :

Il est ici précisé (ou rappelé) :

- ✚ Ne pas commander les matériaux ou débiter les travaux sans la validation du Maître d'Œuvre et du Contrôleur Technique (dans le cas contraire, les travaux seront sous l'entière responsabilité de l'Entreprise, à ses seuls frais exclusifs et devront être repris dans le cas de refus du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre ou du Contrôleur Technique).
- ✚ Un registre du personnel sera renseigné quotidiennement et laissé dans la base vie de chantier.
- ✚ Les ouvriers porteront des badges ou des vêtements au logo de l'Entreprise et seront en possession de la carte BTP.
- ✚ Les situations mensuelles des travaux devront transiter par le Maître d'Œuvre pour vérification, en 2 exemplaires originaux, avec la date, la signature et le cachet de l'Entreprise sur chaque situation ; Les demandes de paiement par anticipation ne seront pas accordées, ni les avances sur les fournitures, seuls les travaux réellement exécutés et constatés seront acceptés. Les situations devront être envoyés au cabinet SILVERT, à l'attention d'Aurore OKRUTNY – 15, boulevard Ernest Noël – BP70031 – 60402 NOYON Cedex.
- ✚ Les Entreprises diffuseront au préalable les situations par mail au Maître d'Œuvre pour validation aux adresses v.frerard@silvert.fr et a.okrutny@silvert.fr.
- ✚ Si l'Entreprise compte produire une caution bancaire, celle-ci devra être présentée à la première situation (originale au Maître d'Ouvrage et copie au Maître d'œuvre), dans le cas contraire, une retenue de garantie de 5.00 % sera appliquée.
- ✚ Tout document envoyé doit être muni d'un bordereau d'envoi, en copie au Maître d'Œuvre, avec l'indication des destinataires et l'objet de l'envoi.
- ✚ Les accès Pompiers et bornes incendie doivent rester libre d'accès.
- ✚ L'Entreprise doit protéger les ouvrages existants.
- ✚ L'Entreprise doit adopter un système d'auto contrôle à chaque instant.
- ✚ Le nettoyage de chantier et des installations doit être soigné au jour le jour.
- ✚ Il est strictement interdit de quitter le chantier sans son nettoyage complet.
- ✚ Interdiction formelle d'utiliser la force électrique depuis les logements ou les parties communes, même pour recharger des batteries ou le téléphone portable (utilisation obligatoire des coffrets de chantier).
- ✚ Interdiction formelle d'utiliser l'eau sans sous-compteur.
- ✚ Les Entreprises qui rencontreront un problème quelconque sur le chantier doivent impérativement en parler au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre lors des réunions de chantier ou en dehors des réunions de chantier.
- ✚ Les ordres techniques sont donnés par le Cabinet Silvert, les demandes du Maître d'Ouvrage transiteront par le Maître d'Œuvre.
- ✚ Faire une demande d'emprise sur la voirie pour les approvisionnements : **Rappel.**

Interventions dans les logements (pour mémoire) :

- ✚ Les prises de rendez-vous sont à la charge de chaque Entreprise.

- ✚ Les difficultés d'accès et/ou d'intervention dans les logements sont à signaler au Maître d'Œuvre avant intervention.
- ✚ Il est ici rappelé que le déplacement des meubles pour exécution des travaux est à la charge de chaque Entreprise (après vidage par les occupants).

Généralités :

- ✚ Le Maître d'ouvrage est susceptible de communiquer aux entreprises intervenant sur le chantier les coordonnées des résidents concernés par la réhabilitation afin de permettre les prises de rendez-vous nécessaires au bon avancement du chantier. Les entreprises ont l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité de ces coordonnées, il est notamment interdit de les communiquer à des tiers sous quelque forme que ce soit ou de les utiliser à un autre usage.
- ✚ Tous les participants sont tenus de prendre connaissance de l'intégralité du compte-rendu.
- ✚ Le compte-rendu est, en outre, la confirmation des ordres donnés sur le chantier lors du rendez-vous. La date de réception du présent compte-rendu ne pouvant en aucune façon être une excuse aux retards apportés dans les réalisations sur le chantier, même en cas d'absence de l'Entreprise dûment convoquée, il appartient à l'Entrepreneur absent de suivre l'avancement du chantier.
- ✚ Il est rappelé que le compte-rendu de chantier est mis à jour régulièrement mais la suppression, dans le dit compte-rendu, d'une tâche qui n'aurait pas été réalisée par une personne ou par l'Entreprise ne les exonère pas de la charge contractuelle d'avoir à l'exécuter. Les éventuelles sanctions ou pénalités afférentes à ces manquements restent contractuellement applicables.
- ✚ Chaque rendez-vous de chantier donne lieu à un compte-rendu établi par le Maître d'Œuvre.
- ✚ Toute remarque sur le présent CR doit être formulée par courrier recommandé.
- ✚ Sans observation formulée par écrit au Maître d'Œuvre de la part des intervenants, le présent compte-rendu est considéré comme accepté sans réserve à partir du compte-rendu suivant.
- ✚ Il est rappelé les mesures réglementaires d'hygiène et de sécurité sur le chantier.
- ✚ FT = Fiche technique.
- ✚ PM = Pour mémoire.
- ✚ PC = Pris en compte par...
- ✚ SO = Sans objet.
- ✚ MO = Maître d'Ouvrage.
- ✚ MOE = Maître d'œuvre.
- ✚ C.SPS = Coordonnateur Sécurité Protection Santé.
- ✚ Ent = Entreprise.

DIVERS :

Les Rendez-vous de Chantier auront lieu : **Tous les lundis à 10 h 30, au bureau de chantier (sauf indication contraire au début du compte-rendu de chantier).**

Les Entreprises convoquées devront être impérativement à l'heure.

Cabinet SILVERT,
Vincent FRÉRARD.

Cabinet SILVERT
Économie de la Construction - Maîtrise d'œuvre
15, boulevard Ernest Noël - BP 70031
60402 NOYON Cedex
Tél. 03.44.44.26.19 - Vincent.frerard@silvert.fr
SAS au capital de 300 000 € - RCS Compiègne 753 551 811

Fin du présent compte-rendu de réunion de chantier.
